

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/11/2023	Inspecteur: Björn De Groof	Mentor:	Installateur: Lieven De Weerd
ID-label:	B.T.W. nr.:-	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT	Serienummer: 22320238		
Datum verslag: 10/11/2023			

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Scheibeeck	Naam	Lieven De Weerd
Huisnummer	5	Straatnaam	Scheibeeck
Busnummer		Huisnummer	5
Postcode	2550	Busnummer	
Gemeente	Edegem	Postcode	2550
Land	België	Gemeente	Edegem
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Lieven De Weerd
		BTW nr.	-
		Telefoonnummer	0479971156
		E-mail	Lieven.de.weerd@skynet.be

Type : woning	EAN : 541448820052939707	Teller Nr. : 1SAG1100660967
----------------------	---------------------------------	------------------------------------

Afbeelding schakel- en verdeelbord:





Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van na 1981 die bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek in overtreding was met de voorschriften van (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.3.2. en en 4.2.3.

Netbeheerder: FLUVIUS	Spanning: 1N400V	Meter / bord verbinding: 10 mm²	Max beveiliging: 63 A
Aantal borden: 2	Aantal kringen: 24		
Aardelektrode: Aardingslus			
Ri algemeen: 3,10 MΩ	RE: 3,78 Ω		

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	24	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	10		2	1,5
2	C	10		2	2,5
10	C	16		2	2,5
5	C	20		2	2,5
2	C	32		2	6
1	C	25	Pv installatie	2	4
1	C	40	Rem automaat	2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/11/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Björn De Groof



Björn De Groof
ACEG VZW - #314

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/11/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

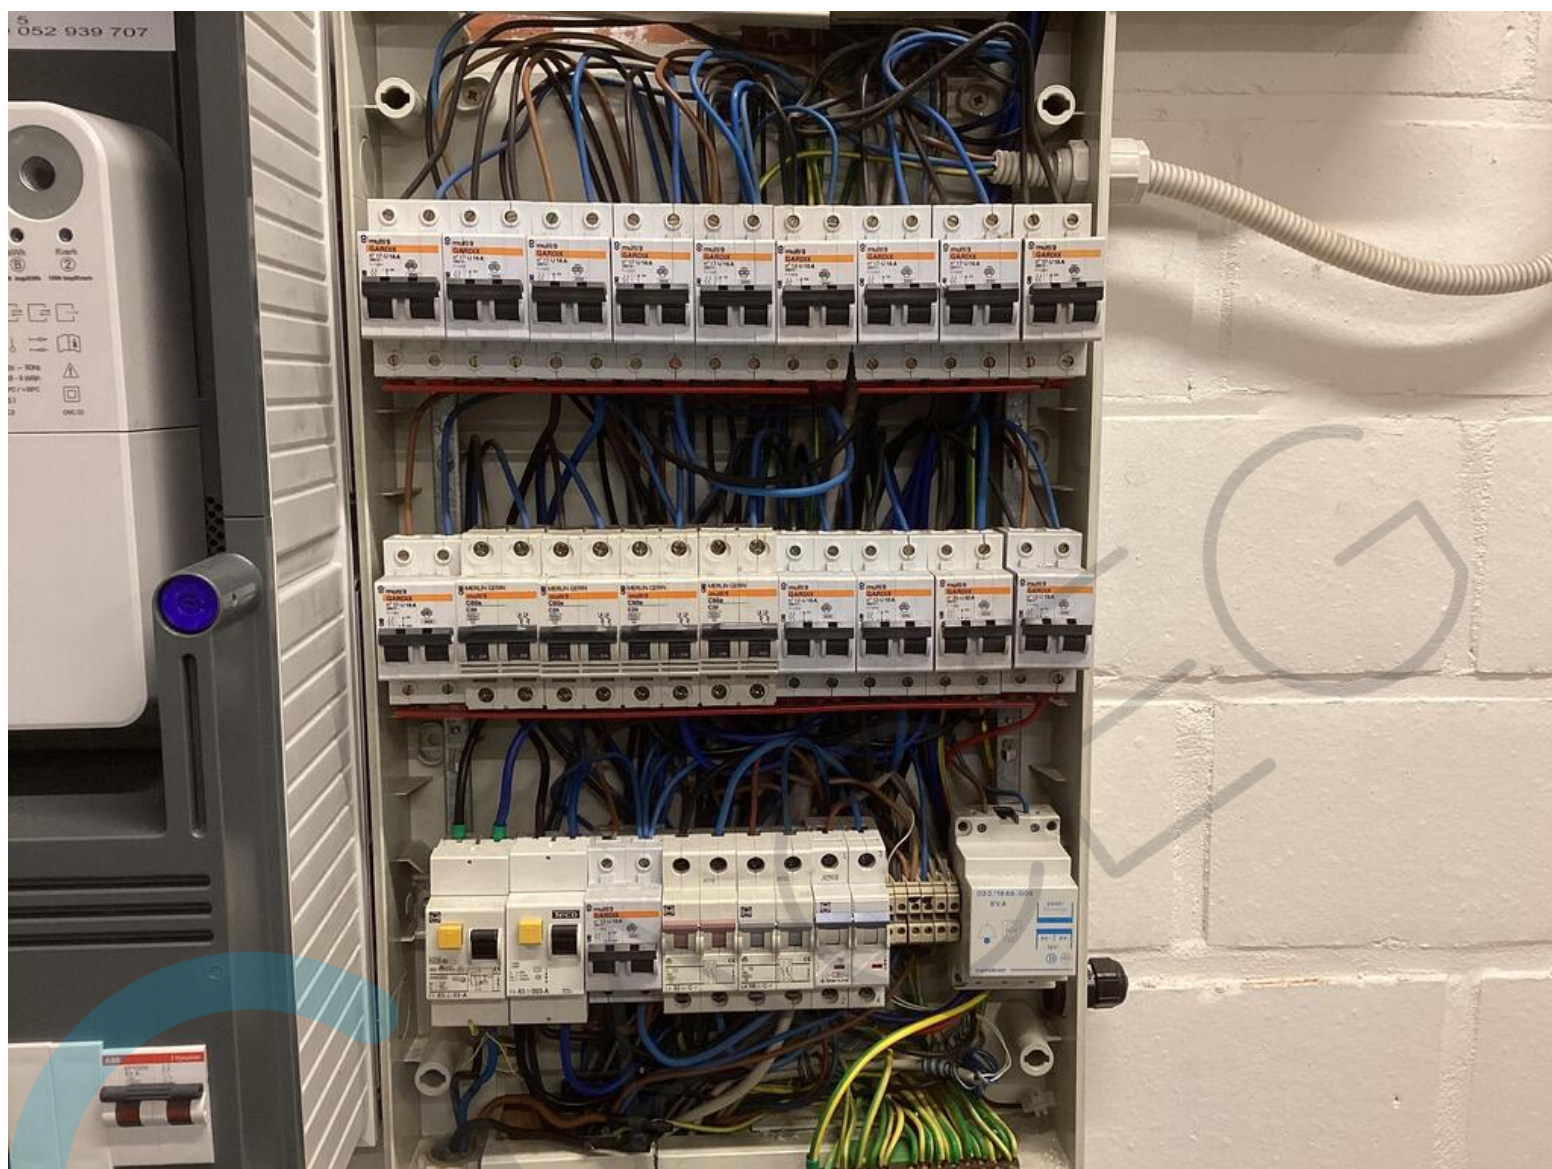















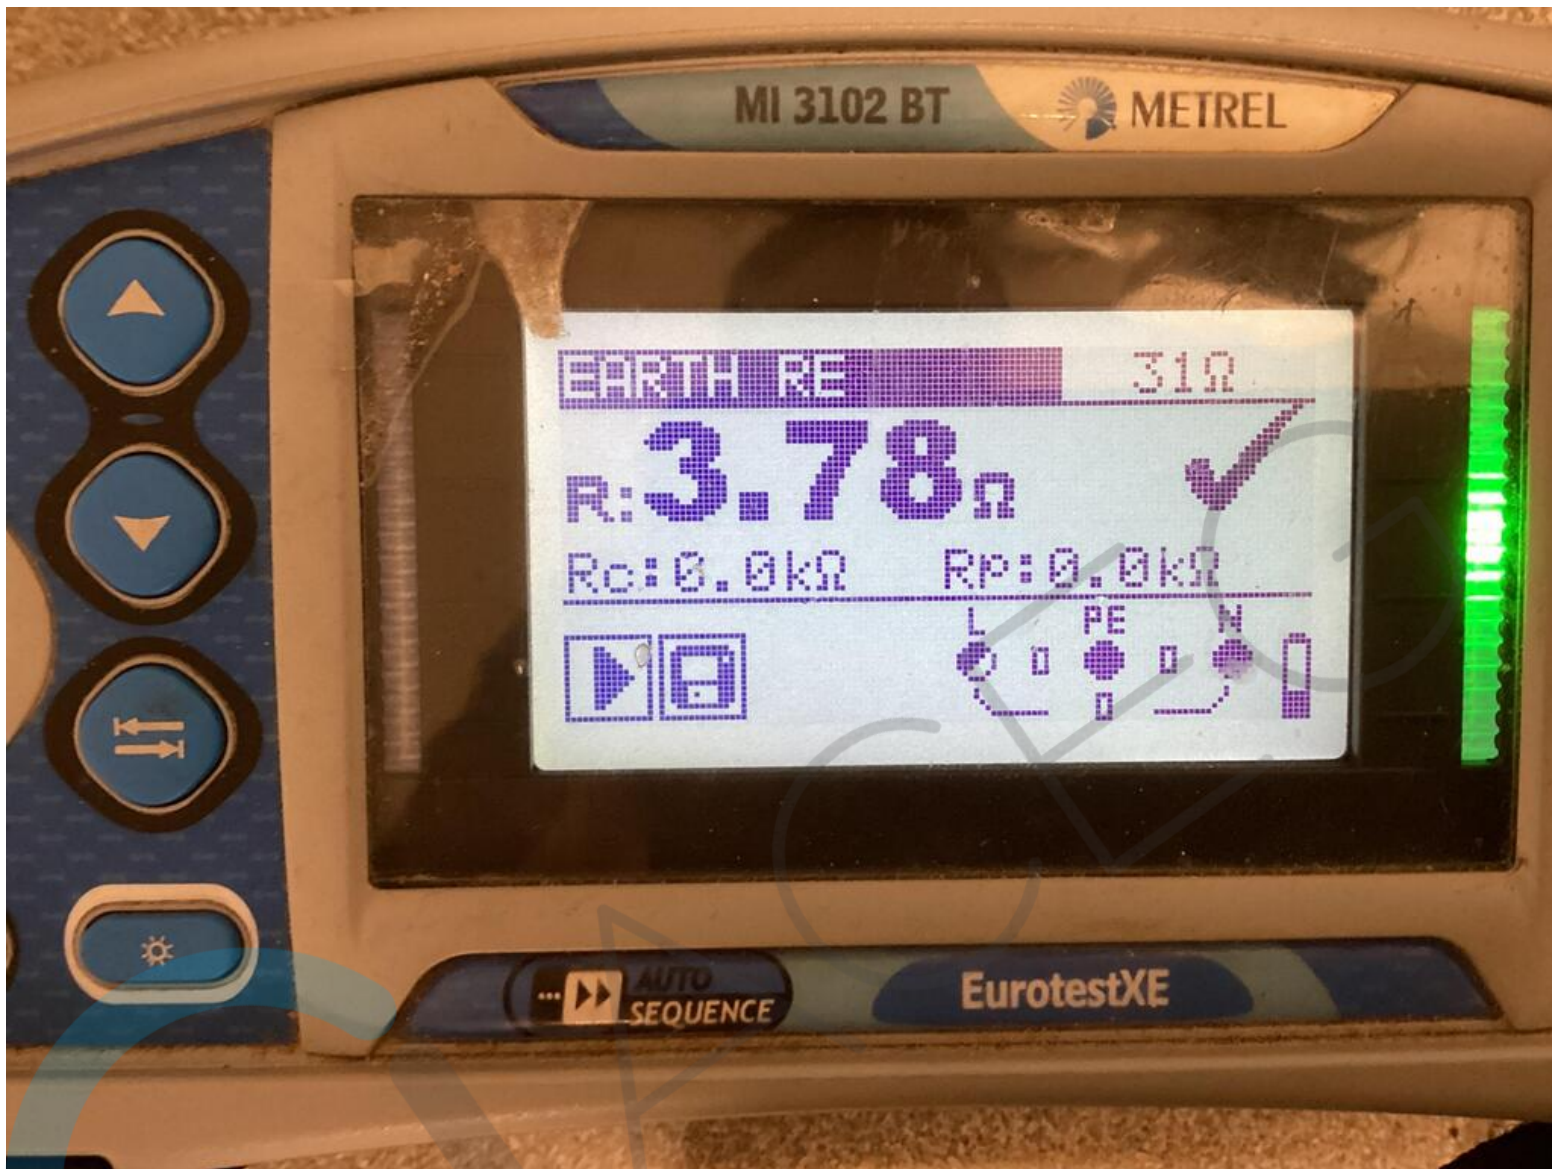

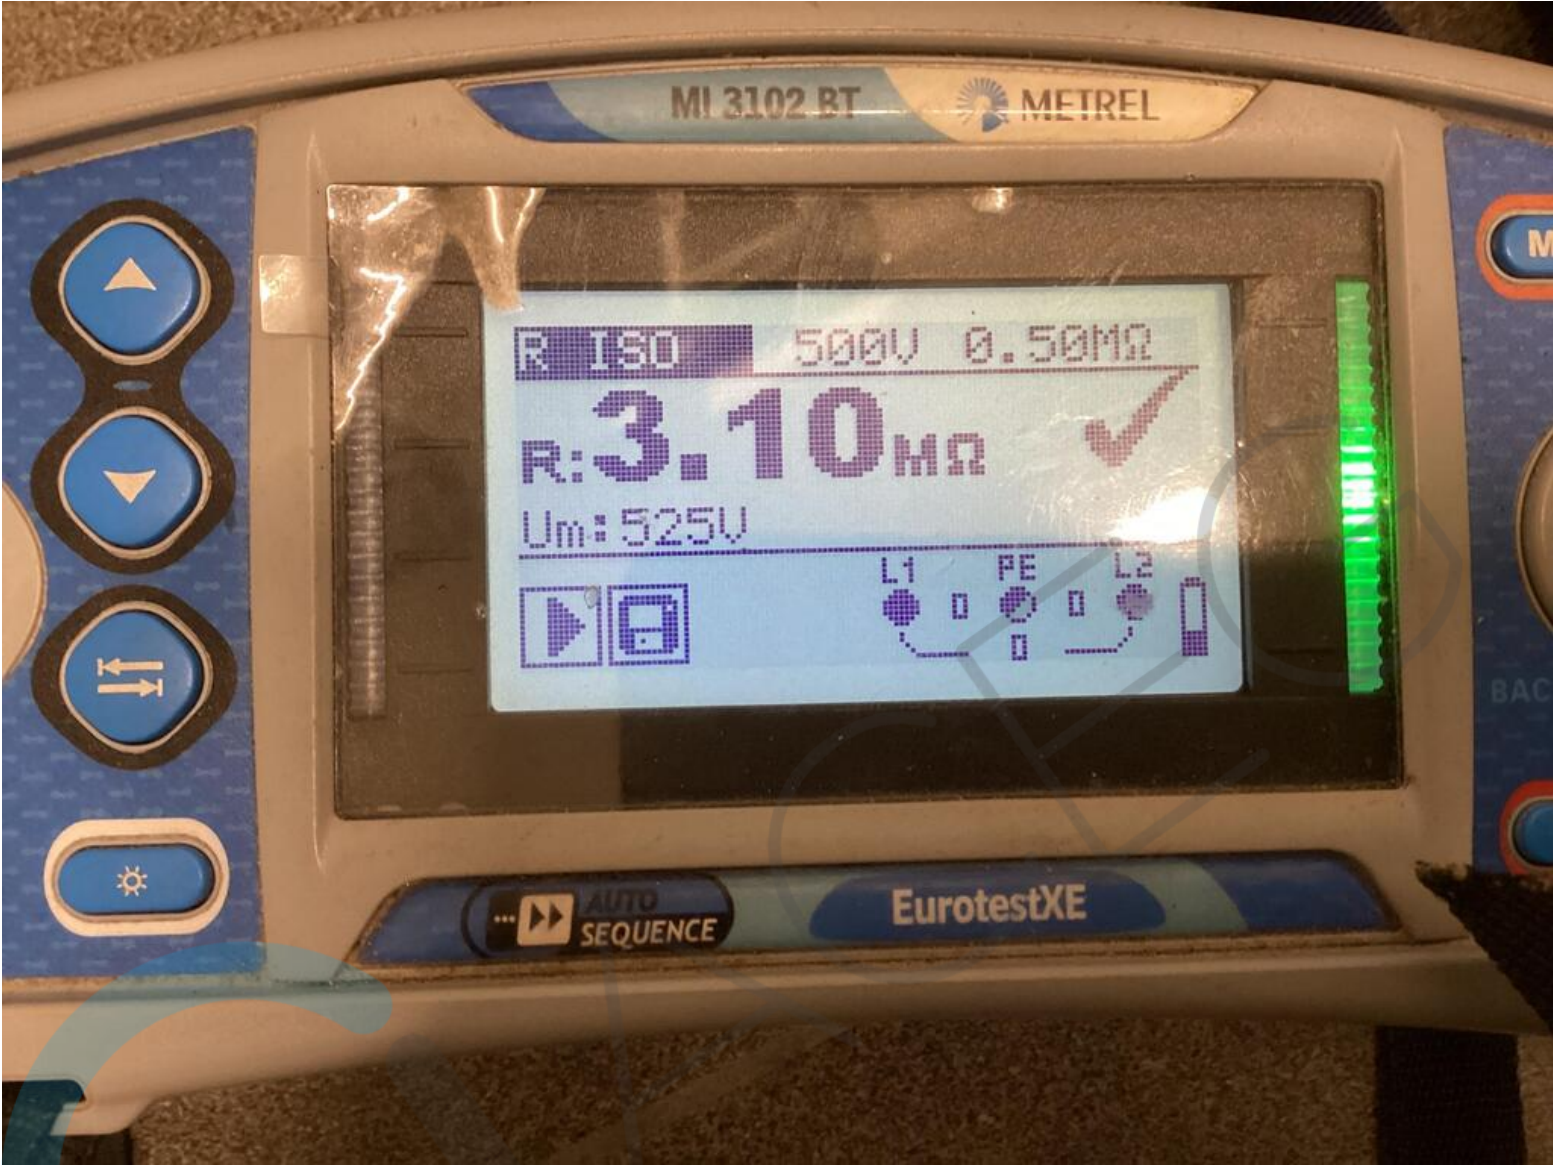


DE WEELO - DE KINDE

SCHEIBEEK 5 Edegem

1/10/92 I.


A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.

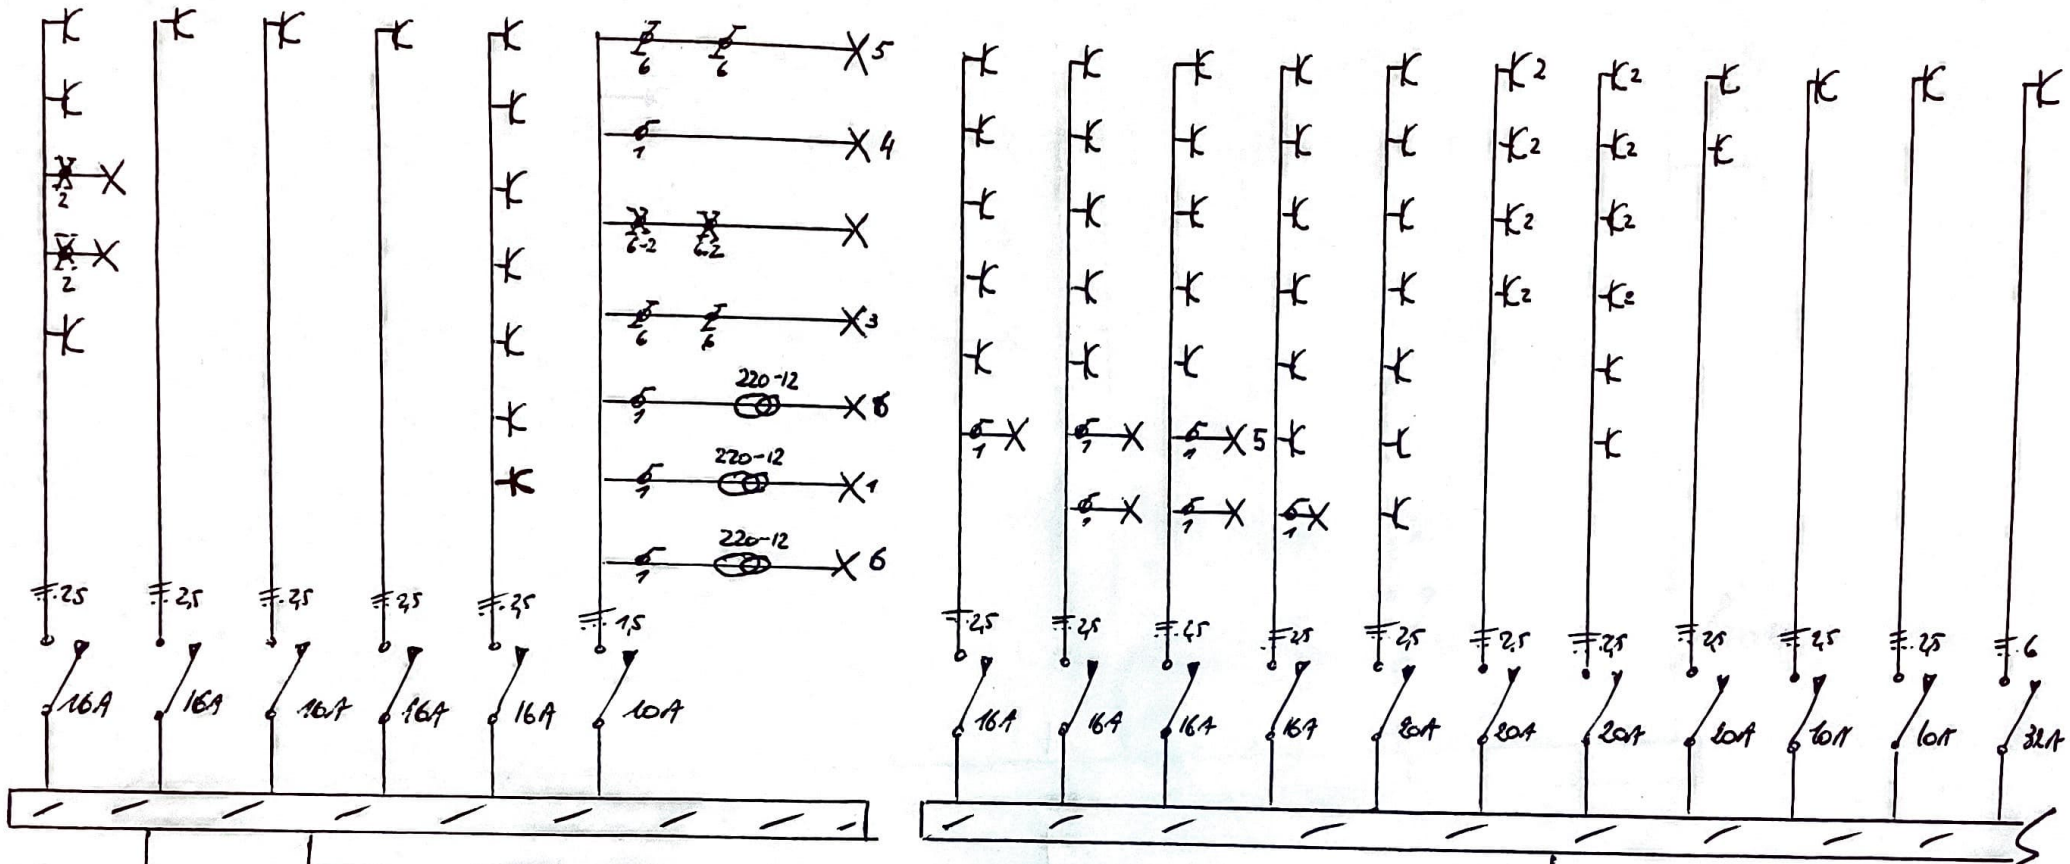

ATECON vzw
Francis BERGEN
0490/66 63 18
francis.bergen@atecon.be

3 Ω

10/11/2022
GACEG 314
Björn De Groof



AIR-VINLOTTE
JAN VAN NIPPEL
BASTIJNSTRAT 51
2500 BEERLAAR
TEL 03 / 22 36 27

ELECTRICITEIT
ANDRE VERHOEVEN
HALFSTRAAT 104
2627 SCHELLE 888 1544

BTW 510 792 892





R

S

T

U

V

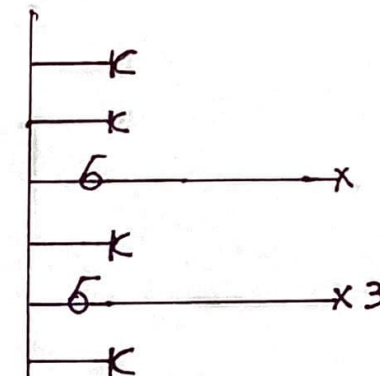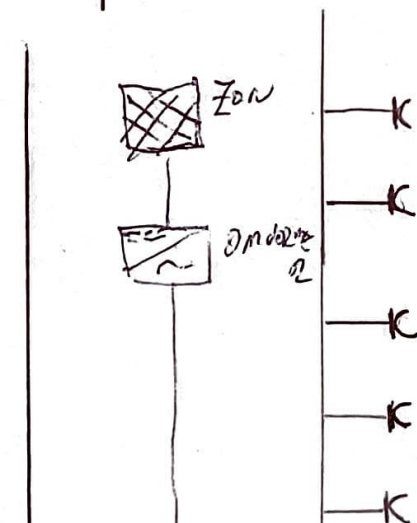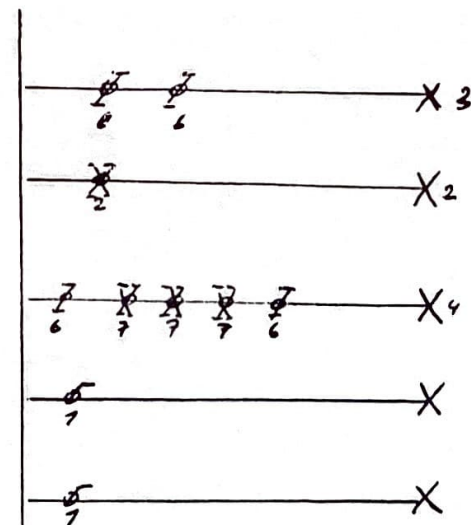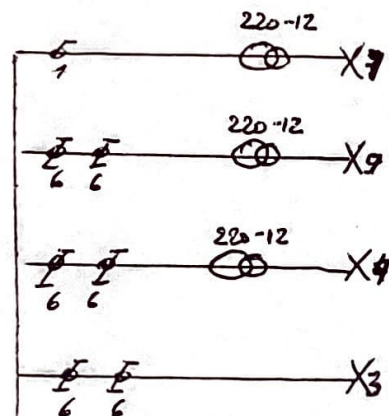

1.5
10A

1.5
10A

6
32A

25A
PV

2.5
16A


2.5
20A



ATECON vzw
Francis BERGEN
0490/66 63 18
francis.bergen@atecon.be

10/11/2012


GACEG
314
Sjörn De Graaf



AIB/VINCOTTE
JAN VAN ROMPAY
BASTIJNSTRAT 51
2510 BERLAAR
TEL 03 / 482 26 27

ELECTRICITEIT
ANDRE VERHOEVEN
HALFSTRAAT 104
2627 SCHELLE 888 1544

BTW 510792 892

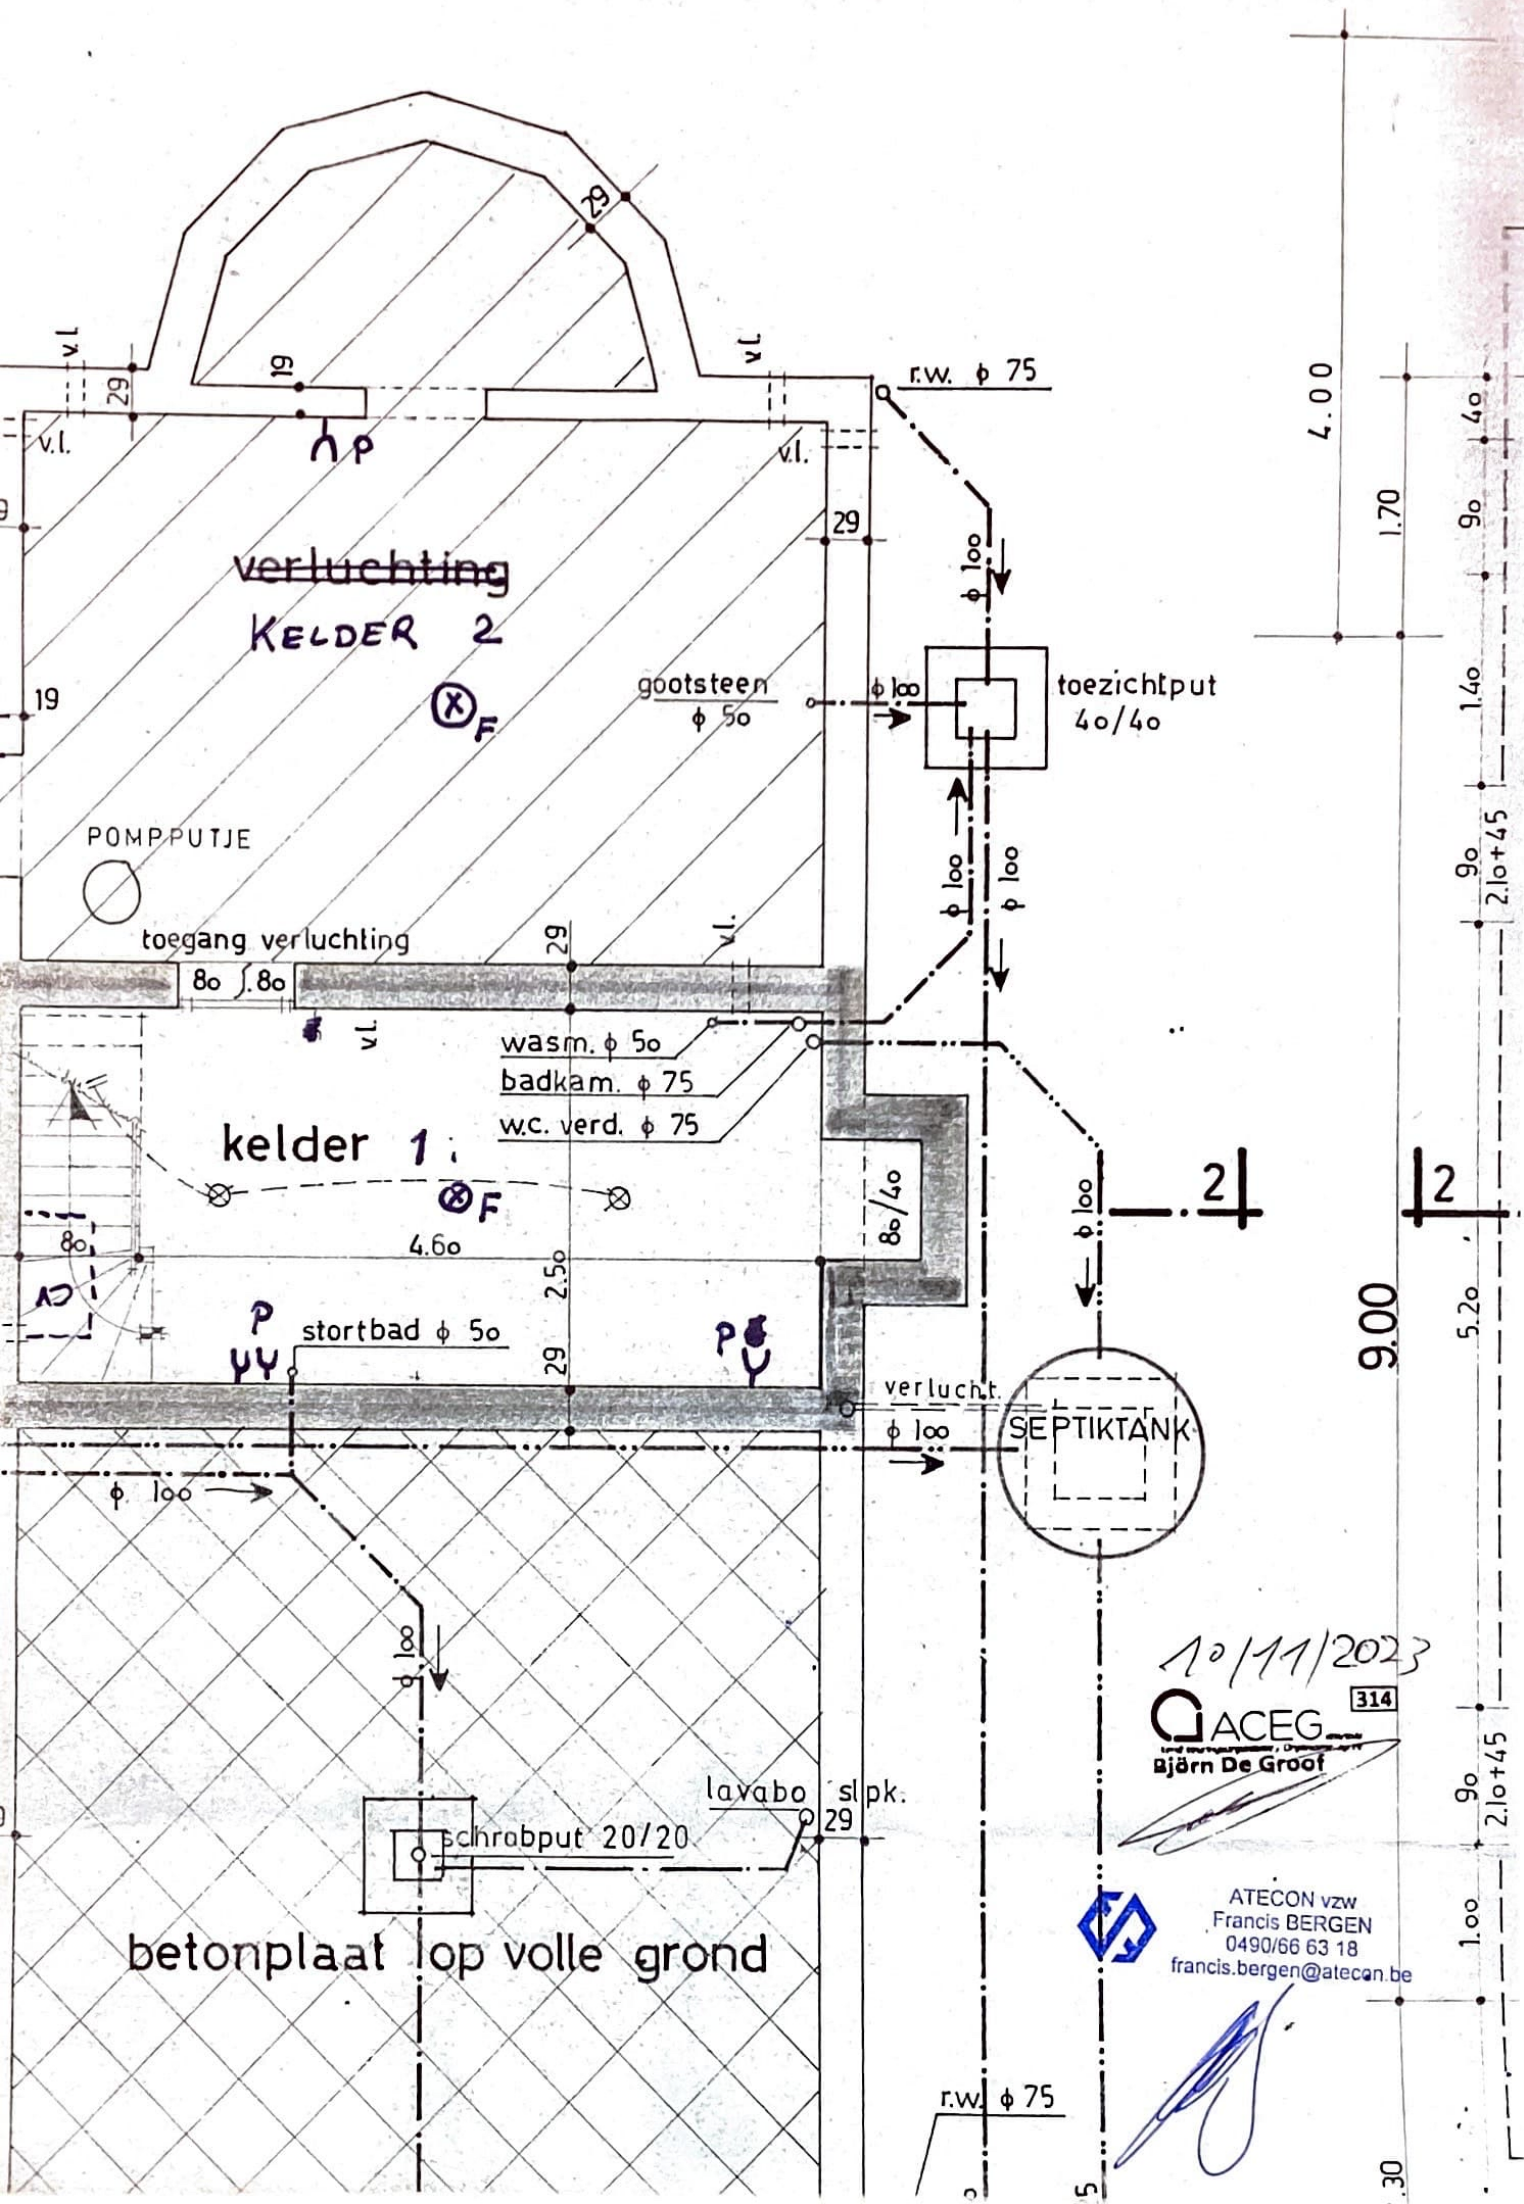

NOTA:

Septiklank

- _ met 20 cm. ondergedompelde overloop
- _ met ontluchting ϕ 75 tot boven dak
- _ met toezichtschacht 60/60 ; afgedekt
- _ met dubbel hermetisch deksel

Konvektorput

- _ afmetingen op te geven door leverancier van de konvektortoestellen

r.w. ϕ 75

d 100

29

v.l.

v.l.

29

v.l.

v.l.

F

KELDER 3
verluchting

F

29

v.l.

19

19

19

w.c. ϕ 75

lavabo ϕ 35

v.l.

v.l.

KELDER 4
verluchting

V

verluchting
KELDER 5

V

10/11/2022


ACEG
Wim De Groot

314

RECON vzw
p/a BERGEN
0490/66 65 18
francis.bergen@recon.be

d 100

29

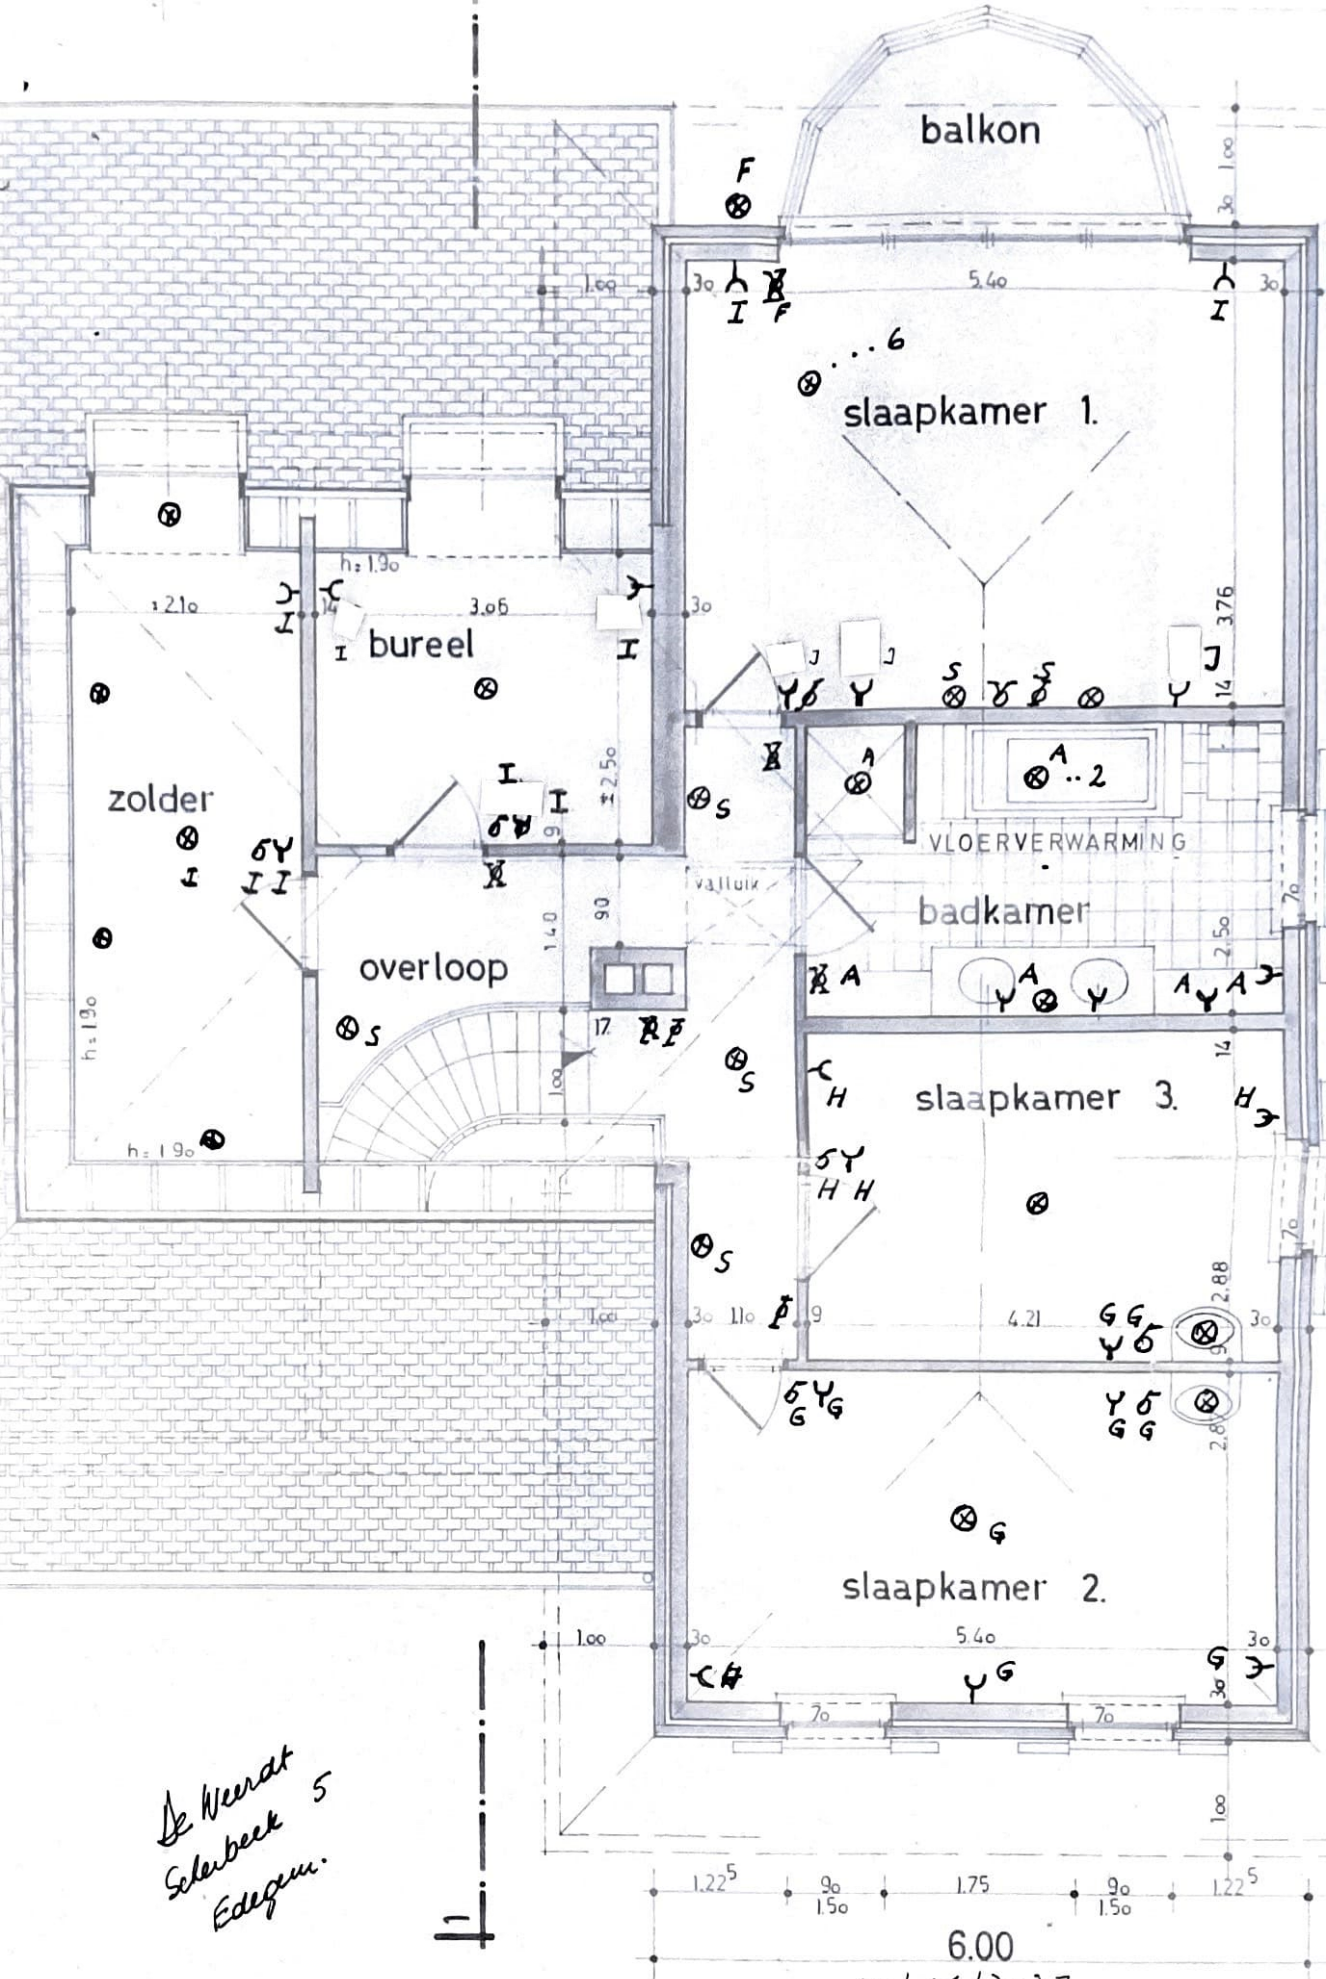

De Weerd
Scherbeek 5
Edelgem.

VERDIEPING

10/11/2023
ACEG 314
Björn De Groof

QACEG **314**
Björn De Greef
